

国道163号 木津東バイパス 工事ニュース

令和2年2月 第5号

国土交通省 京都国道事務所です。

これまで、整備を進めてきた国道163号木津東バイパス（京都府木津川市木津天神山～同市木津馬場南：延長0.6km）は、**令和2年3月15日に開通**することが決まりました。京都府が整備を進めている都市計画道路東中央線（京都府木津川市木津～同市城山町上狛：延長1.5km）と同時開通を予定しており、開通後は木津市街の渋滞緩和やアクセス強化が期待されます。

開通を目前に控え、各工事とも最後の仕上げ作業を鋭意進めているところです。これまでの地域の皆様及び道路利用者の皆様のご理解とご協力にお礼申し上げますとともに、最後まで安全には十分に留意し、工事を進めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

現在の状況と予定

現在の工事状況は以下のとおりです。

○国道163号 木津東バイパス

- ・本線の舗装工事や側道の工事など、開通に向けた仕上げの工事を行っています。


○国道24号

- ・井関川橋が完成し、2月上旬に仮橋から本橋に自動車交通を切り替えました。現在、舗装工事や付帯工事を行っています。
- ・なお、木津奈良道交差点周辺については、木津東バイパス開通後も引き続き工事を行う予定です。

契約工事

現在、契約中の工事は以下のとおりです。各工事の概要については別紙をご覧ください。

- ①「木津東バイパス木津地区改良工事」・・・(株)吉川組
- ②「木津東バイパス木津地区舗装工事」・・・明清建設工業(株)
- ③「木津東バイパス標識設置工事」・・・大共道路設備(株)
- ④「木津東バイパス大谷交差点改良工事」・・・(株)長村組
- ⑤「国道24号井関川橋下部(左岸)工事」・・・(株)吉川組
- ⑥「国道24号井関川橋上部工事」・・・オリエンタル白石(株)
- ⑦「国道24号木津奈良道交差点改良工事」・・・(株)平和建設

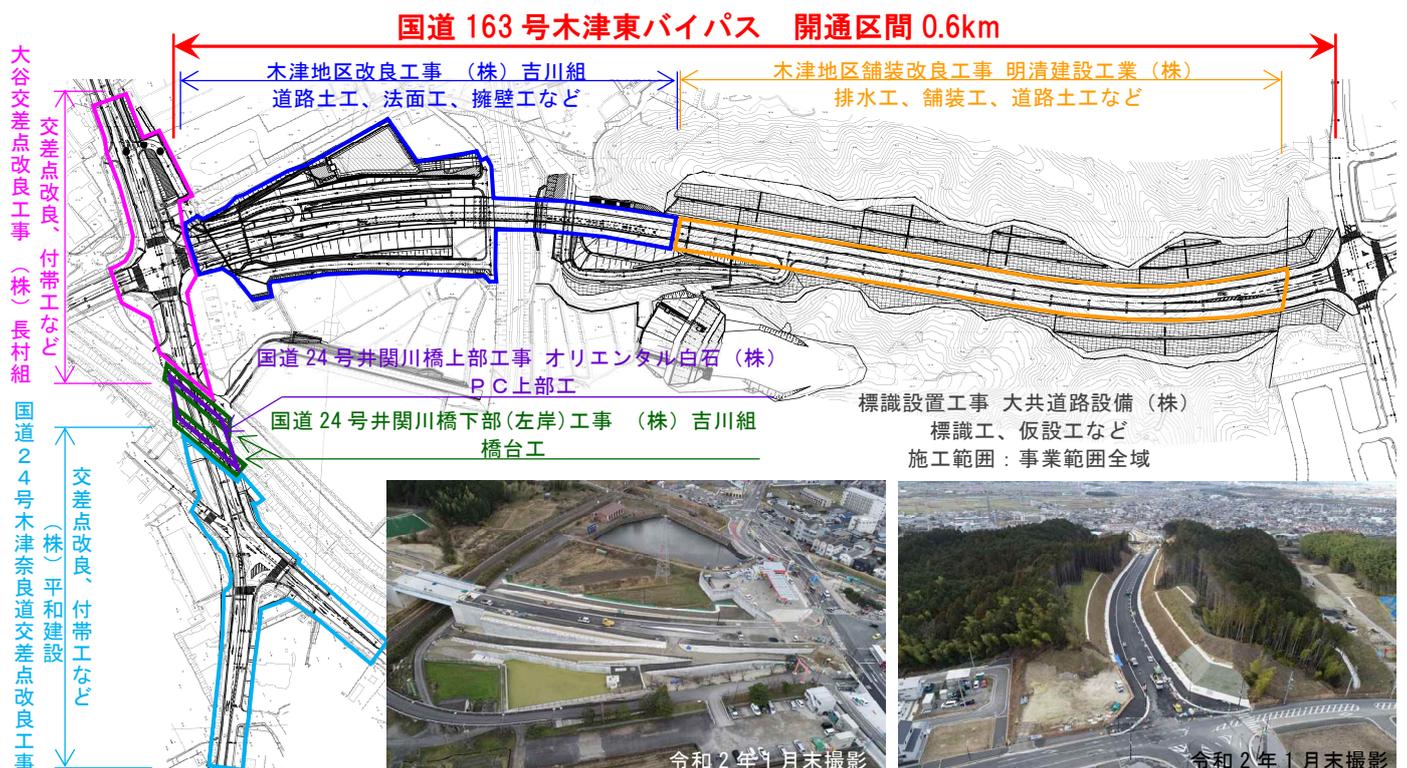

工事名：木津東バイパス木津地区改良工事

(木津東バイパス大谷地区で道路盛土を行う工事です)


工事進捗率 99.7 % (※事業進捗率とは異なります) 令和2年1月31日 現在

工事概要 …… 道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、調整池工 1式
構造物撤去工 1式、仮設工 1式、舗装工 1式

工期 …… 平成31年2月6日 ~ 令和2年3月20日

工事の状況 …… 本工事も終盤に差し掛かり、盛土工事や擁壁工事が完了しました。現在、残りの舗装工事や防護柵工事等、開通に向けた仕上げの作業を進めています。

平面図

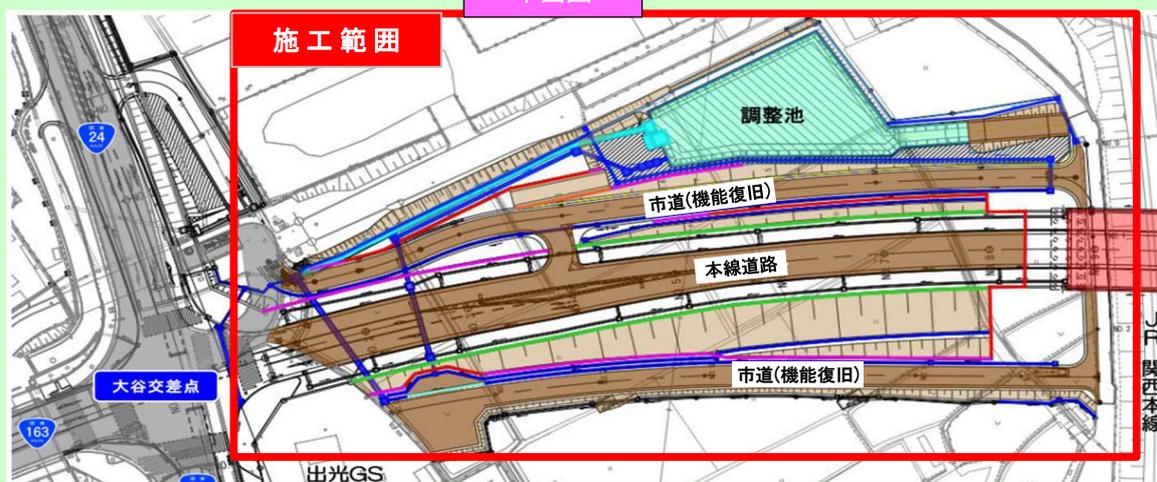

本工事進捗状況写真



近隣の皆様には、いつもお世話になっております。3月15日の開通を目指し安全第一で努めてまいりますので、今後ともご理解・ご協力のほど宜しくお願い致します!!

(株) 吉川組 現場代理人 村中 克啓

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 太田

TEL 075-313-0009

(株)吉川組 木津東バイパス工事事務所

TEL 0774-94-6518

工事名：木津東バイパス木津地区舗装工事

(木津東バイパスの天神山地区を舗装する工事です)

工事進捗率 90.0% (※事業進捗率とは異なります) 令和 2年1月31日現在

工事概要 …… 舗装工 1式 橋梁上部工 1式 道路土工 1式 情報ボックス工 1式


工期 …… 平成31年2月23日 ~ 令和2年3月20日

工事の状況 …… JRの跨線橋の架設が無事に完成しました。

開通までわずかとなりましたが、現在、残り作業の排水構造物、電気設備等、舗装工事を進めています。

平面図

写真①

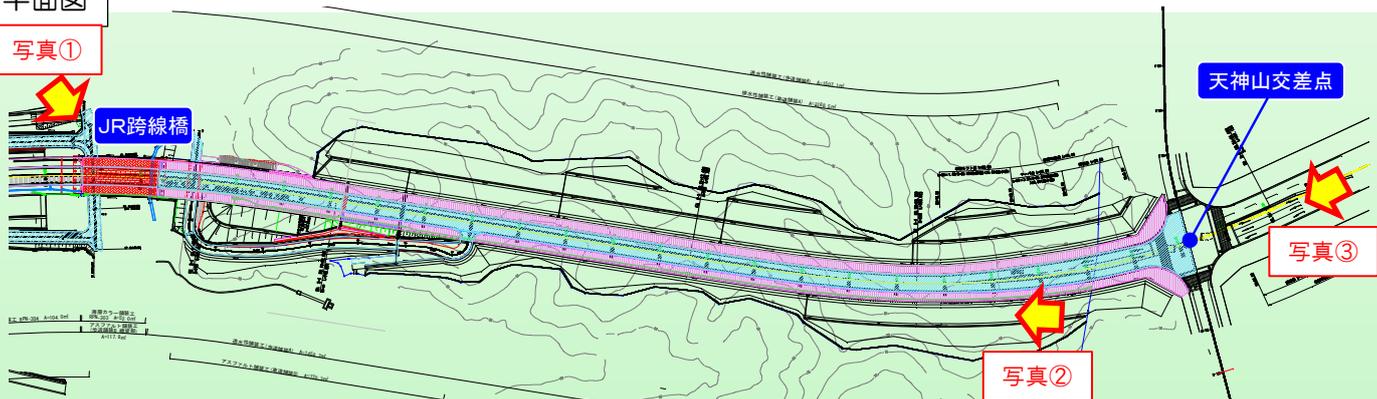

写真①



写真②



写真③



近隣及び地域住民の皆様、いつもお世話になっております。3月15日の開通を目指して頑張りますので、今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



明清建設工業(株)

現場代理人
杉山 敬

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 太田

TEL 075-313-0009

明清建設工業株式会社 木津東バイパス現場事務所

TEL 075-681-7563

工事名：木津東バイパス標識設置工事


(木津東バイパスに関連する道路標識を更新する工事です)

工事進捗率 97.2% (※事業進捗率とは異なります) 令和2年1月31日現在

工事概要 …… 標識工 1式 仮設工 1式

工期 …… 平成31年3月5日 ~ 令和2年3月30日

工事の状況 …… 現在、木津東バイパス部の道路標識については設置・更新が終り、開通時にマスキングを撤去する作業のみとなりました。残りの現道部につきましても開通まで安全第一で工事を進めてまいります。

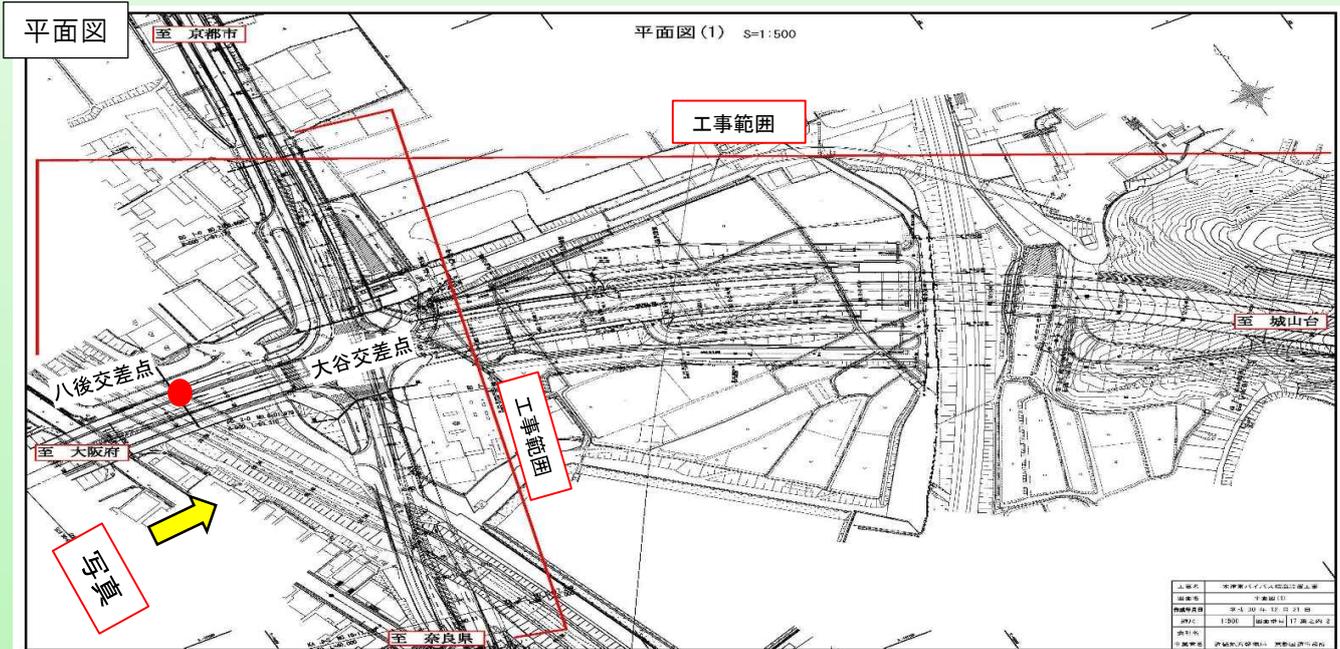

本工事は、木津東バイパス関連の道路標識の新設、及び国道(24号・163号)の既設道路標識を更新する工事です。

現道は交通規制を伴う作業になります。作業中交通渋滞等が発生することも予想されますが、ご協力をお願いします。



大共道路設備(株)

現場代理人
坪田 勇人

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 太田
大共道路設備株式会社

TEL 075-313-0009

TEL 06-6793-6801

工事名：木津東バイパス大谷交差点改良工事


(国道24号と国道163号が交差する大谷交差点を改良する工事です)

工事進捗率 86.0% (※事業進捗率とは異なります) 令和2年 1月31日現在

工事概要 …… 交差点改良及び付帯工事 1式 取付道路構築 1式
舗装工事(井関川橋を含む) 1式 地下道延伸工事 1式 電線共同溝 1式

工期 …… 平成31年 3月 8日 ~ 令和2年3月20日

工事の状況 …… 現在、大谷交差点部の歩道拡幅及び車道・歩道舗装を施工をしています。
開通に向け、安全第一で工事を進めてまいります。

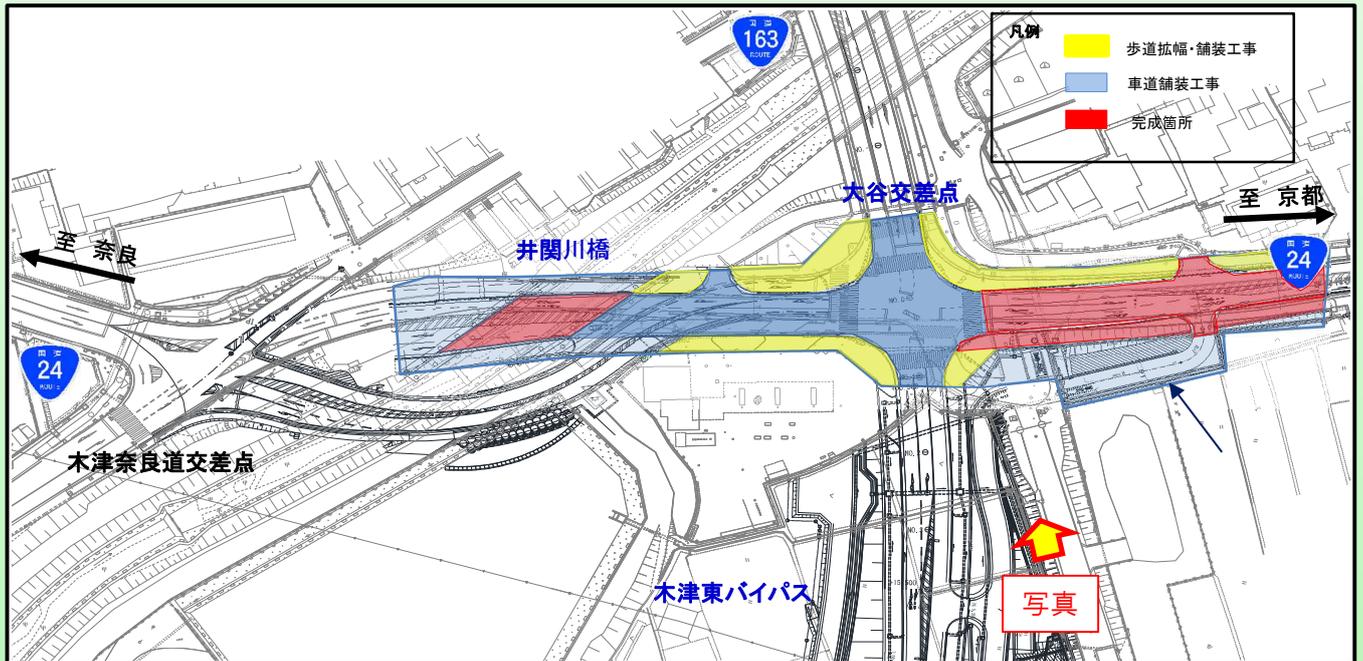

本工事は、交通量の多い大谷交差点を改良する工事です。現状の交通を確保しながらの施工となることから、一般車両や歩行者・自転車に特に注意を払い、安全を最優先とした工事を進めてまいります。引き続き開通に向け夜間作業や片側交互通行を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。



株式会社 長村組
現場代理人
藤原 大輔

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 太田 TEL 075-313-0009
(株)長村組 木津東バイパス現場事務所 TEL 0774-66-7667

工事名：国道24号井関川橋下部(左岸)工事

(国道24号の井関川橋の橋台を作る工事です)


工事進捗率 92.2% (※事業進捗率とは異なります) 令和2年1月31日現在

工事概要 …… 橋台工 1式、踏掛版工 1式、法覆護岸工 1式、根固め工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式

工期 …… 平成31年2月6日 ~ 令和2年3月20日 (変更)

工事の状況 …… 昨年(令和元年)の11月末に橋台工事が完了しました。

現在、井関川橋架替に伴う残工事として、護岸の復旧工事を行っています。

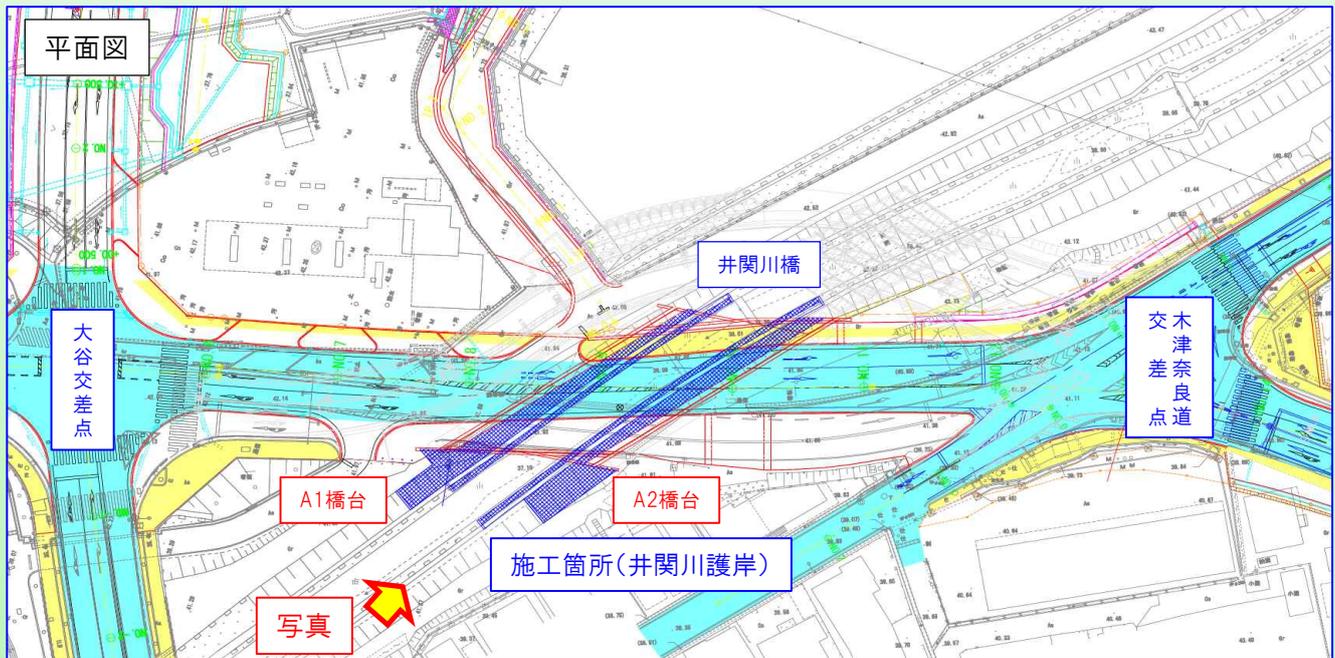

昨年、上部工事にバトンタッチを行なっただけからは、河川の護岸復旧工事を行っており、来月上旬には完成を迎える予定です。引き続き安全作業に努め、周囲の環境に配慮しながら作業を進めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



株式会社 吉川組
現場代理人
田中 謙次

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 太田
(株)吉川組 井関川橋2工事事務所

TEL 075-313-0009

TEL 0774-66-3412

工事名：国道24号井関川橋上部工事


(国道24号の井関川橋の橋桁を架ける工事です)

工事進捗率 100.0% (※事業進捗率とは異なります) 令和2年1月31日現在

工事概要 …… コンクリート製橋梁の工場製作・輸送、現地での架設・橋面工事

工期 …… 平成31年2月26日 ～ 令和2年2月29日

工事の状況 …… 2月上旬をもって現場での工事は完了しました。

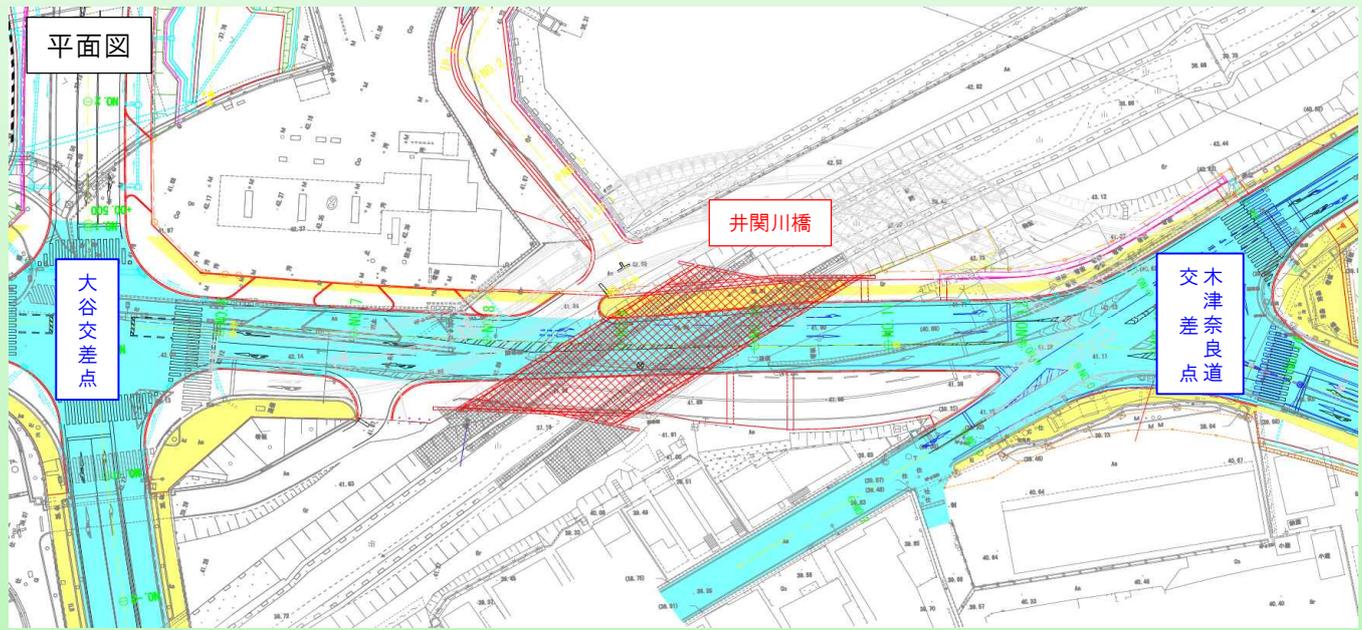

昨年10月より着工し、非常にタイトな工程の中で苦勞しましたが、施工の工夫及び協力業者も含め懸命に動いてくれたお陰で、無事故で完成を迎えることが出来ました。

近隣の皆様方には工事期間中、御理解と御協力を賜りありがとうございました。



オリエンタル白石(株)
現場代理人
青山 大輝

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 太田

オリエンタル白石株式会社 大阪支店

TEL 075-313-0009

TEL 06-6446-0263

工事名：国道24号木津奈良道交差点改良工事

(国道24号と府道・市道が交差する木津奈良道交差点を改良する工事です)



工事進捗率 14.2% (※事業進捗率とは異なります) 令和2年1月31日現在

工事概要 …… 交差点改良及び付帯工事 1式 迂回路(国道24号)撤去工事 1式

工期 …… 令和1年6月22日 ~ 令和2年6月30日(変更予定)

工事の状況 …… 2月上旬に新しく架け替えた井関川橋への切替のための舗装工事が完了しました。

現在、木津奈良道交差点の改良工事を行っています。

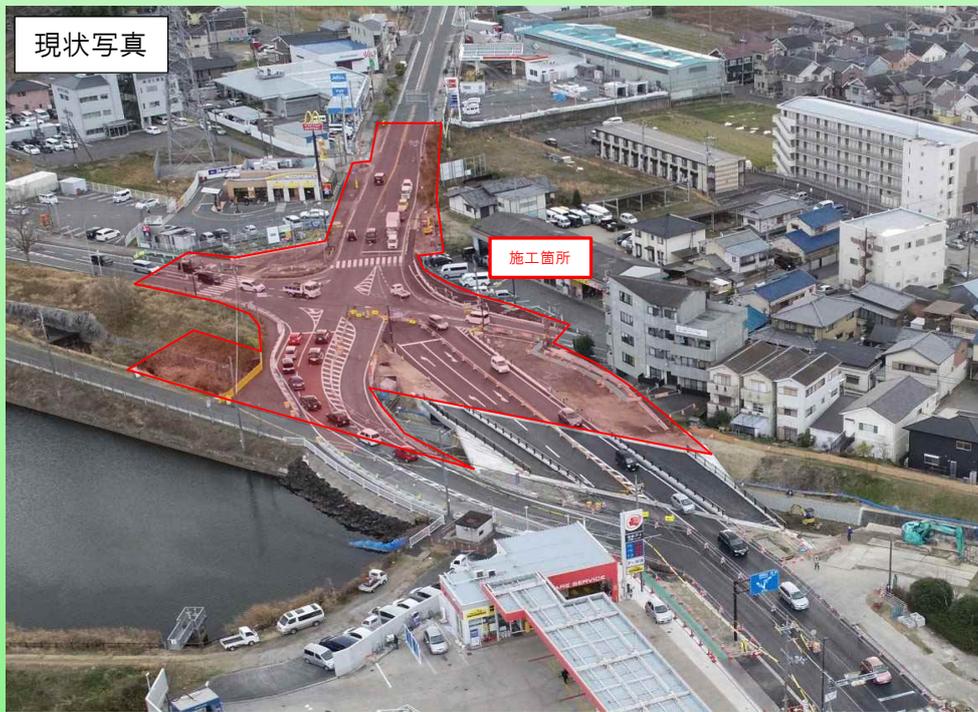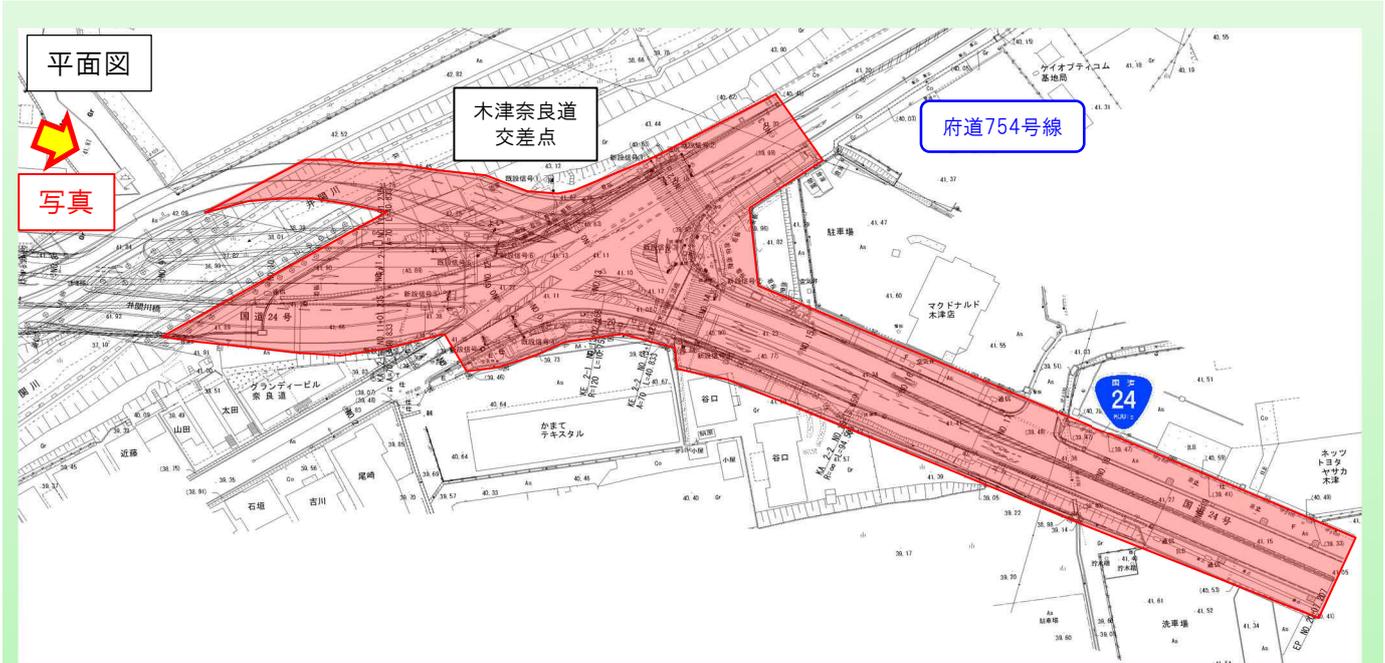

1月末からの架替後の井関川橋への切替も無事終了し、今後は奈良方面に向け工事を進めていきます。併せて迂回路橋の撤去も行なっていく予定です。引続き夜間工事を行うことから、近隣の皆様方には工事期間中、何かとご迷惑をお掛け致しますが、御理解と御協力の程宜しくお願い申し上げます。

(株)平和建設
現場代理人
北川 雅文

《お問い合わせ先》



京都国道事務所 建設監督官 太田
(株) 平和建設

TEL 075-313-0009

TEL 0771-20-2053
